📊 Migration Planning - TPS Website

Timeline Migrasi Infrastruktur Server Web dan Database | PT Terminal Petikemas Surabaya

Tanggal Mulai: 3 Februari 2026 | Target Go-Live: 21 Februari 2026

TOTAL AKTIVITAS	SELESAI	SEDANG BERJALAN	PENDING	TOTAL DURASI	PROGRESS
18	8	1	9	19 Hari	44%

📅 Gantt Chart - Timeline Migrasi (Februari 2026)

Aktivitas	Durasi	Sab 1	Min 2	Sen 3	Sel 4	Rab 5	Kam 6	Jum 7	Sab 8	Min 9	Sen 10	Sel 11	Rab 12	Kam 13	Jum 14	Sab 15	Min 16	Sen 17	Sel 18	Rab 19	Kam 20
FASE 1: Persiapan Infrastruktur Selesai	**0.5 hari**																				
Setup PostgreSQL 16 (DB Server)	0.5 hari			✓																	
Setup Docker (App Server)	0.5 hari			✓																	
Konfigurasi Keamanan & Network	0.5 hari			✓																	
FASE 2: Deployment Aplikasi Selesai	**0.5 hari**																				
Build Docker Image & Troubleshooting	0.5 hari			✓																	
Fix Database Connection	0.5 hari			✓																	
FASE 3: Migrasi Data Selesai	**0.5 hari**																				
Migrasi Database (17,728 records)	0.5 hari			✓																	
Migrasi File Uploads (4.7 GB)	0.5 hari			✓																	
FASE 4: Pengujian & Bug Fixing Berjalan	**8 hari**																				
Pengujian Halaman Publik	0.5 hari			✓																	

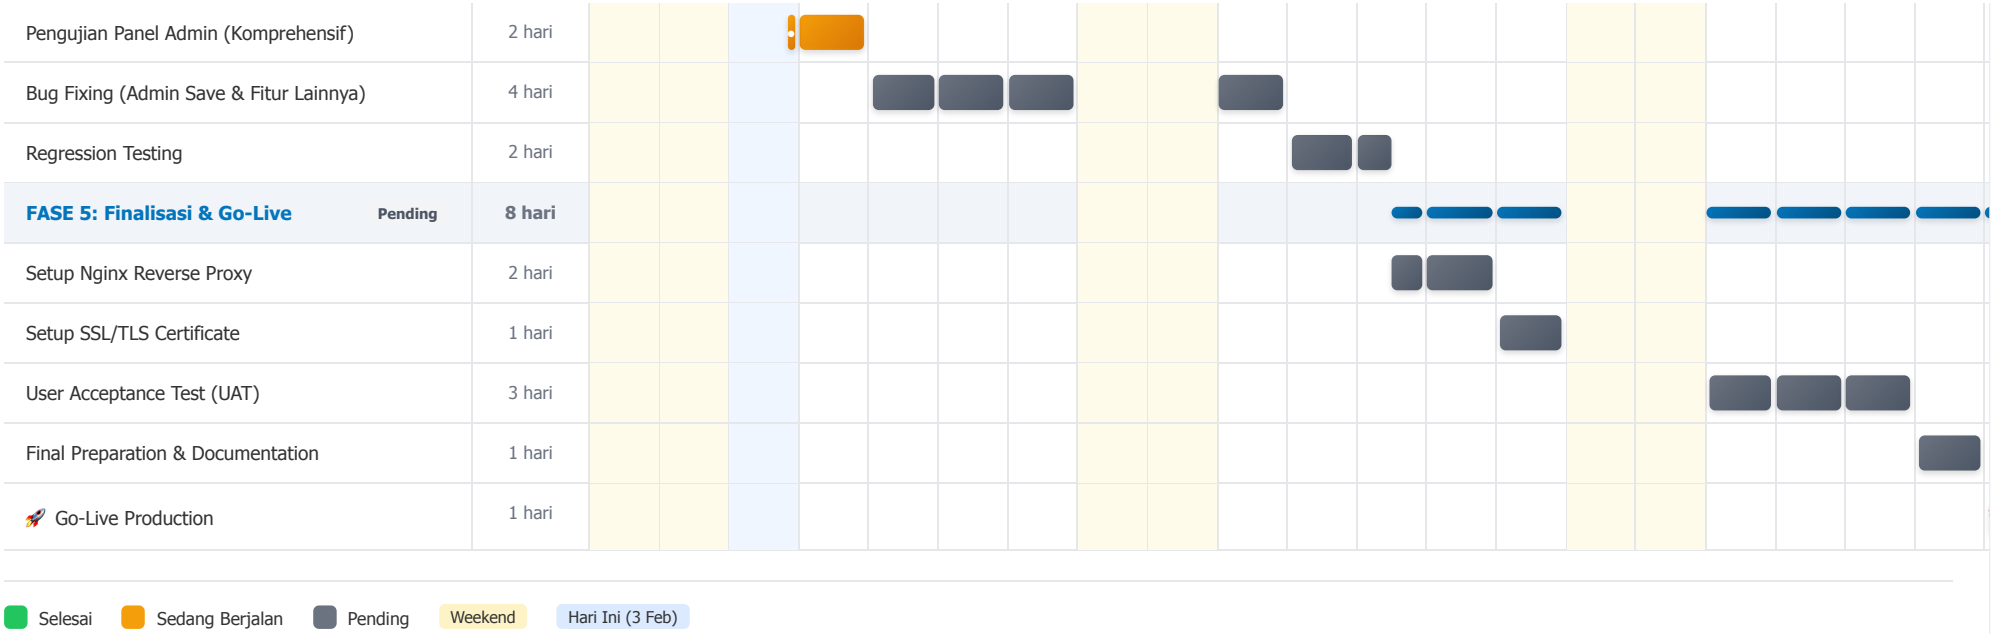

Ringkasan Aktivitas & Durasi

No	Fase	Aktivitas	Durasi	Tanggal	Status
FASE 1: Persiapan Infrastruktur (0.5 hari)					
1	Infrastruktur	Setup PostgreSQL 16 (DB Server)	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
2	Infrastruktur	Setup Docker (App Server)	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
3	Infrastruktur	Konfigurasi Keamanan & Network	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
FASE 2: Deployment Aplikasi (0.5 hari)					
4	Deployment	Build Docker Image & Troubleshooting	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
5	Deployment	Fix Database Connection	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
FASE 3: Migrasi Data (0.5 hari)					
6	Migrasi	Migrasi Database (17,728 records)	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai

No	Fase	Aktivitas	Durasi	Tanggal	Status
7	Migrasi	Migrasi File Uploads (4.7 GB)	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
FASE 4: Pengujian & Bug Fixing (8 hari kerja)					
8	Pengujian	Pengujian Halaman Publik	0.5 hari	3 Feb 2026	Selesai
9	Pengujian	Pengujian Panel Admin (Komprehensif)	2 hari	3-4 Feb 2026	Berjalan
10	Bug Fixing	Bug Fixing (Admin Save & Fitur Lainnya)	4 hari	5-10 Feb 2026	Pending
11	Testing	Regression Testing	2 hari	11-12 Feb 2026	Pending
FASE 5: Finalisasi & Go-Live (8 hari kerja)					
12	Finalisasi	Setup Nginx Reverse Proxy	2 hari	12-13 Feb 2026	Pending
13	Finalisasi	Setup SSL/TLS Certificate	1 hari	14 Feb 2026	Pending
14	UAT	User Acceptance Test	3 hari	17-19 Feb 2026	Pending
15	Preparation	Final Preparation & Documentation	1 hari	20 Feb 2026	Pending
16	Go-Live	🚀 Go-Live Production	1 hari	**21 Feb 2026**	Pending

📝 Catatan Penting

✅ Selesai Hari Ini (3 Februari 2026, 09:00 - 13:30 WIB):

- Setup infrastruktur: PostgreSQL 16 + Docker 29.2.1
- Deployment aplikasi: Bun 1.1.20 (Debian image)
- Migrasi database: 17,728 content records
- Migrasi file uploads: 4.7 GB (compressed transfer)
- Pengujian halaman publik: Homepage, Berita, Karir, Layanan - PASS

⚠️ Bug Ditemukan & Pekerjaan Lanjutan:

- Fungsi simpan konten di panel admin tidak berfungsi
- Perlu pengujian komprehensif semua fitur admin
- Bug fixing estimasi 4 hari kerja
- Regression testing diperlukan setelah bug fixing

📌 **Milestone Berikutnya:**

- 3-4 Feb: Pengujian panel admin komprehensif (2 hari)
- 5-10 Feb: Bug fixing admin save & fitur lainnya (4 hari)
- 11-12 Feb: Regression testing (2 hari)
- 12-13 Feb: Setup Nginx reverse proxy (2 hari)
- 14 Feb: Setup SSL certificate (1 hari)
- 17-19 Feb: User Acceptance Test / UAT (3 hari)
- 20 Feb: Final preparation & documentation (1 hari)
- **21 Feb: 🚀 Go-Live Production**
